

Más y mejor
infraestructura y
dotación para acercar
la salud a la gente



BOGOTÁ
Construye **esperanza**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD






Con proyectos de infraestructura en diferentes zonas de Bogotá, aseguramos la cobertura de todos los sectores de la población al reducir desplazamientos y desigualdad en el acceso a la salud.



Se discutió mucho sobre modelos de atención a la población antagonizando con la construcción de infraestructura. Nosotros creemos en una convergencia. Necesitamos un modelo integral e integrado de salud.

17 FRENTES DE OBRA EN BOGOTÁ:

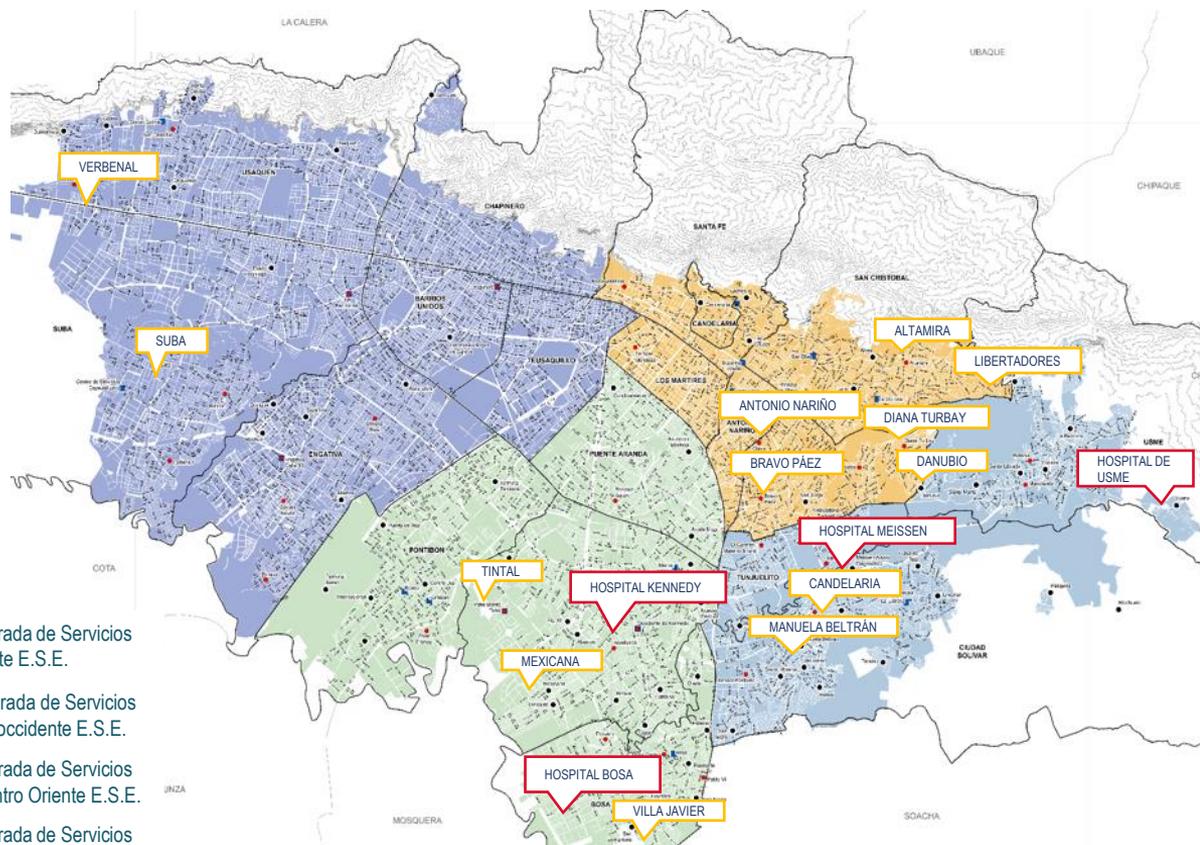

- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
- Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E.
- Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

4 Hospitales y **13** Centros de Salud.

- De **1,8** billones del cuatrenio, ya fueron comprometidos **500.645** millones para infraestructura y dotación hospitalaria.
- **254 mil** m² de intervención en obra.
- **953** camas nuevas para la ciudad.





SUBRED CENTRO ORIENTE



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL

NUEVO SAN JUAN DE DIOS

Reposición y dotación del nuevo hospital Santa Clara del conjunto hospitalario San Juan de Dios.



Población
beneficiada

338.373



Tiempo de construcción
(Meses)

23



Lote polígono M2

40.062



M2 intervenidos

44.000



Empleos totales
(proyectados)

2.499



Número de camas

312



Cuantía del contrato (pesos)

507.845 millones



HOSPITAL

NUEVO SAN JUAN DE DIOS

Reposición y dotación del nuevo hospital Santa Clara del conjunto hospitalario San Juan de Dios.



Imagen de referencia

Estado: El proyecto se encuentra en etapa de pre-construcción en el desarrollo de estudios y diseños.

En proceso de aprobación de proyecto ante el Ministerio de Cultura.

Entrega proyectada: Semestre II - 2024

Convenio: 1201-2018.

Contrato de obra: 02-BS-008-2020.

Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa, sucursal Colombia.

Contrato interventoría: 02-BS-038-2020

Consorcio Salud Bogotá 01.



CENTROS DE SALUD EN OBRA



ANTONIO NARIÑO

Adecuación, terminación y dotación

Valor total del Proyecto: \$3.637 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 117.859

M2 Lote: 614

M2 intervenidos: 1.140

Empleos generados: 91

De la localidad: 4

Estado: En obra

Avance de obra: 100 %

Entrega proyecto: 2021-II



CENTROS DE SALUD EN OBRA



LIBERTADORES

Adecuación, terminación y dotación

Valor total del Proyecto: \$2.639 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 24.854

M2 Lote: 1.476

M2 intervenidos: 1.492

Empleos generados: 79

De la localidad: 25

Estado: En obra.

Avance de obra: 100%

Entrega proyecto: 2021-II



CENTROS DE SALUD EN OBRA



DIANA TURBAY

Construcción y Dotación

Valor total del Proyecto: \$17.101 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 271.914

M2 Lote: 1593

M2 intervenidos: 3.975.

Empleos generados: 93

De la localidad: 44

Estado: En obra.

Avance de obra: 44%

Entrega proyecto: 2022-I



CENTROS DE SALUD EN OBRA



ALTAMIRA

Adecuación, terminación y dotación

Valor total del Proyecto: \$6.539 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 32.309

M2 Lote: 817

M2 intervenidos: 1.091

Empleos proyectados: 62

Estado: En obra.

Avance de obra: 8%

Entrega proyecto: 2022-I



CENTROS DE SALUD



BRAVO PÁEZ

Construcción y Dotación

Valor total del Proyecto: \$20.198 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 38.196

M2 Lote: 1.508

M2 intervenidos: 2.860

Empleos proyectados: 162

Estado: Con acta inicio de obra.

Entrega proyecto: 2022-I



CENTROS DE SALUD

PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN

- Hospital San Blas (Pediátrico)
- Hospital La Victoria (Salud Mental)





SUBRED NORTE



CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES



CENTRO DE SALUD SUBA

Adecuación y Terminación

Valor total del Proyecto: \$9.062 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 43.646

M2 Lote: 2.246

M2 intervenidos: 1.921

Empleos generados: 53

De la localidad: 20

Estado: En obra.

Avance de obra: **61%**

Entrega proyecto: 2022-I



CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES



CENTRO DE SALUD VERBENAL

Reposición y dotación

Valor total del Proyecto: \$14.799 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 39.011

M2 Lote: 617

M2 intervenidos: 1.596

Empleos proyectados: 76

Estado: Demolición.

Entrega proyecto: 2022-II



CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES



HOSPITAL DE SUBA

Adecuación y Dotación

Valor total del Proyecto: \$31.220 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 379.656

M2 Lote: 4.448

Empleos proyectados: 255

Estado: En proceso de adjudicación.

Entrega proyecto: Por definir



CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES



CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ

Adecuación y Dotación

Valor total del Proyecto: \$26.631 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 403.541

M2 Lote: 10.475

M2 intervenidos: 12.890

Empleos proyectados: 733

Estado: Apertura de proceso en curso.

Entrega proyecto: 2023-II



CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES

PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN

- Salas de cirugía Hospital Simón Bolívar.
- Reposición Hospital Simón Bolívar.
- Parque Hospitalario de Engativá.





SUBRED SUR



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL DE USME

Construcción y dotación nuevo Hospital de Usme



Población beneficiada

454.275



Tiempo de construcción

(Meses)

23



Lote M2

50.710



M2 intervenidos

30.873



Empleos totales

185



Número de camas

221



Cuantía del contrato(pesos)

292.495 millones

Jóvenes < 28 Mujeres

43

09

De la localidad



21



HOSPITAL DE USME

Construcción y dotación nuevo Hospital de Usme



Estado: Construcción. Avance de obra: 22,50%

Entrega: Segundo semestre de 2023.

Acta de inicio de obra: 4 de marzo de 2021.

Convenio: 676500 de 2018.

Contrato de obra: 3843-2020.

Consorcio Nuevo Hospital de Usme.

Contrato interventoría: 4363-2020.

Consorcio Interventoría Hospital de Usme.



HOSPITAL MEISSEN-TORRE 2

Adecuación y terminación de la Torre No. 2 de la Unidad de Servicios de Salud Meissen y
Dotación de la Nueva Infraestructura.



Población beneficiada

459.554



Tiempo de construcción

(Meses)

12



Lote M2

3.815



M2 intervenidos

6.913



Empleos totales

165



Número de camas

90



Cuantía del contrato(pesos)

\$ 46.762 millones

Jóvenes < 28 Mujeres

46

19

De la localidad



65



HOSPITAL

MEISSEN-TORRE 2

Adecuación y terminación de la Torre No. 2 de la Unidad de Servicios de Salud Meissen y dotación de la nueva infraestructura.



Estado: Construcción. Avance: 65.0%

Entrega: Primer semestre de 2022.

Convenio: 1186-2017.

Contrato de obra: 6380-2020.

Consorcio CAP CP MEISSEN.

Contrato interventoría: 6341-2020.

Unión Temporal Inter USS MEISSEN.



CENTROS DE SALUD



MANUELA BELTRÁN

Construcción y Dotación

Valor total del Proyecto: \$19.626 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 40.092

M2 Lote: 2.418

M2 intervenidos: 3.642

Empleos generados: 195

De la localidad: 62

Estado: En obra

Avance de obra: **79 %**

Entrega proyecto: 2021-II



CENTROS DE SALUD



CANDELARIA LA NUEVA

Adecuación y Terminación

Valor total del Proyecto: \$20.725 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 48,850

M2 Lote: 3.380

M2 intervenidos: 4.265

Empleos generados: 69

De la localidad: 34

Estado: En obra

Avance de obra: 35 %

Entrega proyecto: 2022-I



CENTROS DE SALUD



DANUBIO

Adecuación y Terminación

Valor total del Proyecto: \$20.331 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 27.500

M2 Lote: 3.677

M2 intervenidos: 3.604

Empleos proyectados: 205

Estado: En obra

Avance de obra: **9 %**

Entrega proyecto: 2023-II



CENTROS DE SALUD



TUNAL

Construcción y Dotación

Valor total del Proyecto: \$15.571 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 53.300

M2 Lote: 17.041

M2 intervenidos: 2.530

Empleos proyectados: 91

Estado: Obra en contratación.

Entrega proyecto: 2022-II



CENTROS DE SALUD

PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN

- **Centro de Salud San Juan** (Tipo de contratación: Llave en mano. Diseño y construcción)
- **Centro de Salud Nazareth** (Tipo de contratación: Llave en mano. Diseño y construcción)





SUBRED SUR OCCIDENTE



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL DE BOSQA.

Diseño, financiación, construcción dotación operación, reposición, mantenimiento y reversión de los equipos y la infraestructura hospitalaria del Hospital de Bosa.



Población beneficiada

411.149



Tiempo de construcción

(Meses)

21



Lote M2

19.074



M2 intervenidos

32.196



Empleos totales

140



Número de camas

215



Cuantía del contrato(pesos)

552.887 millones

Jóvenes < 28 Mujeres

34

17

De la localidad



17



HOSPITAL DE BOSA

Diseño, financiación, construcción dotación operación, reposición, mantenimiento y reversión de los equipos y la infraestructura hospitalaria del Hospital de Bosa.

Primer Hospital Público universitario concebido, diseñado, construido y dotado para el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular detección de cáncer y cuidados paliativos entre otras.



Estado: Obra. Avance: 1,25%*
Entrega: Segundo semestre de 2023.
Inicio de obra: 03 de septiembre de 2021.

Convenio: N° 2301650 de 2020.

Contrato de obra APP N° 0002-2020.
Promotora Hospital Bosa.

Contrato interventoría N°1483797 de 2020.
Consortio Hospital Bosa 08.



TORRE DE URGENCIAS KENNEDY

Reforzamiento y ampliación de Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de atención.



Población beneficiada

462.210



Tiempo de construcción

(Meses)

34



Lote M2

3.748



M2 intervenidos

13.344



Empleos totales

165



Número de camas

102



Cuantía del contrato(pesos)

96.489 millones

Jóvenes < 28 Mujeres

46

19

De la localidad



18



TORRE DE URGENCIAS KENNEDY

Reforzamiento y ampliación de Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de atención.



Estado: Construcción. Avance: 35,92%

Entrega: Segundo semestre de 2022.

Convenio: 1864-2016.

Contrato de obra: 4763-2018.

Consortio Quirón.

Contrato interventoría: 5205-2018.

Consortio Kennedy 2018.



CENTROS DE SALUD



VILLA JAVIER

Adecuación y Terminación

Valor total del Proyecto: \$13.493 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 39.137

M2 Lote: 3.318

M2 intervenidos: 2.260

Empleos generados: 47

De la localidad: 13

Estado: En obra

Avance de obra: **27,8 %**

Entrega proyecto: 2021-II



CENTROS DE SALUD



TINTAL

Adecuación y Terminación

Valor total del Proyecto: \$14.822 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 58.729

M2 Lote: 1.899

M2 intervenidos: 2.813

Empleos generados: 100

De la localidad: 18

Estado: En obra

Avance de obra: 26,3 %

Entrega proyecto: 2022-I



CENTROS DE SALUD



MEXICANA

Construcción y Dotación

Valor total del Proyecto: \$13.911 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 16.217

M2 Lote: 3.400

M2 intervenidos: 2.287

Empleos generados: 130

De la localidad: 20

Estado: En obra

Avance de obra: 7,5 %

Entrega proyecto: 2022-II



CENTROS DE SALUD



CAPS 29

Construcción y Dotación

Valor total del Proyecto: \$4.573 (Cifra en Millones)

IMPACTO DEL PROYECTO

Población beneficiada: 48.283

M2 Lote: 750

M2 intervenidos: 1.305

Empleos proyectados: 75

Estado: Estructuración contratación.

Entrega proyecto: 2022-II



CENTROS DE SALUD

PROYECTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

- Centro de Salud Trinidad Galán
- Centro de Salud Pablo VI



La ciudadanía podrá consultar el estado del avance de las obras en el Observatorio de Salud de Bogotá



SaluData
Observatorio de Bogotá
Datos abiertos, gobierno transparente

<https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/ofertas-de-servicios-de-salud/veeduriasinfraestructura/>



Gracias



SECRETARÍA DE
SALUD

